Al contestar por favor cite:
Radicado No: **20221010004941**

Sincelejo, 11 de noviembre de 2022

Señora
GLORIA DEL SOCORRO FLOREZ FLOREZ
Procuradora 19 Judicial II Ambiental y Agraria de Sucre
gdflorez@procuraduria.gov.co; embarreto@procuraduria.gov.co
Sincelejo

REFERENCIA: Intervención administrativa ambiental - Convocatoria Reunión - Informe de cumplimiento de sentencia - Acción popular Enrique Otero Dajud radicado: 2015- 000259, fallo de Septiembre de 2018, segunda instancia.
ASUNTO: Alcance a rendición de informe en reunión llevada a cabo el día 26 de octubre de 2022.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta los distintos temas tratados durante la reunión celebrada el día 26 de octubre de 2022 a las 9:00 am en las instalaciones de Aguas de Sucre para realizar seguimiento al cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia de fecha 28 de septiembre de 2018 y dado los compromisos adquiridos por nuestra empresa en aras de brindar soporte frente a lo manifestado durante el desarrollo de la misma, nos permitimos remitir:

1. Publicación del medio de comunicación EL TIEMPO en fecha 23 de febrero de 2002 donde se evidencia que nuestra operación inició con una continuidad de una hora cada ocho días. Ello con el fin de corroborar la importante y notoria mejora en la prestación del servicio de acueducto en el municipio de Sincelejo por parte de Aguas de la Sabana S.A. E.S.P.

EL TIEMPO

SUSCRÍBETE X $900 1ER MES

EL AGUA, UN PRIVILEGIO EN SINCELEJO

Un verdadero privilegio resulta, en pleno siglo XXI, que en barrios de la Capital de Sucre llegue el servicio de agua potable, menos, una hora cada 8 días a los 37 mil usuarios de la ciudad.

Compartir
Comentar
Guardar
Reportar
Portada

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO | 23 de febrero 2002 , 12:00 a. m.

Un verdadero privilegio resulta, en pleno siglo XXI, que en barrios de la Capital de Sucre llegue el servicio de agua potable, por lo menos, una hora cada 8 días a los 37 mil usuarios de la ciudad.

A pesar de que la entidad surte de agua a la ciudad, a través de 18 pozos que producen 440 litros por segundos, por el irregular estado de la tubería se pierde el 40 por ciento del preciado líquido.

Técnicos del Ministerio de Desarrollo sostienen que para abastecer a toda la ciudad los pozos deben producir unos 700 litros por segundo.

Ponte al día | Lo más visto

11:50 P. M. ATAQUES CON ÁCIDO
Cada semana hay al menos un ataque con ácido: ¿cómo prevenirlos?

11:15 P. M. CARLOS MATTOS
Mattos: tras llegar a Colombia, estos son los líos judiciales que enfrenta

10:26 P. M. ATAQUES CON ÁCIDO
¡Atención! Ya son tres los ataques con ácido a hombres en Chapinero

2. Resumen de la discriminación del catastro de redes por longitud material y estado de las mismas. Las redes existentes tanto para el componente de acueducto como el de alcantarillado sanitario en el municipio de Sincelejo, son las siguientes:

Redes existentes en servicio del sistema de acueducto Municipio de Sincelejo - Dic. 2020									
PROCESO	**Diám. (pulg)**	**MATERIAL / LONGITUD (m)**							**Longitud total (m)**
		ACP	**HF**	**HD**	**PVC**	**AC**	**PEAD**	**ACERO**	
Aducción	6			337					337
	8			559	415				973
	10				22	857	65		944
	12		467	13.060		5.133	3.172	2.205	24.038
	14			6.437		6.089		56	12.582
	16			1.566					1.566
	18			3.779					3.779
	24			4.585					4.585
	28			6.382					6.382
	32			5.303					5.303
Conducción	8						89		89
	16			16				6.963	6.979
	24	13.759		84					13.843
	32	317		8.368					8.685
Red Matriz	24	3.618		848		945			5.411
	20	1.094		1.915				59	3.068
	18			21					21
	16	183		1.003	6.568			37	7.790
	14			966	5.320	4.678		9	10.974
	12		949	4.125	6.089	3.034	2.422		16.619
	10		170	1.372	9.258	2.363	8.536		21.699
	8			3.442	9.401	7.033	12.227		32.103
Redes Distribución	6			11	13.601	4.235	10.228		28.075
	4			33	40.866	5.653	45.201		91.752
	3			52	207.973	24.564	122.744		355.333
	2.5				4.555				4.555
	2				31.471		3.211		34.682
Long. Total Gral (m)		**18.970**	**1.586**	**64.264**	**335.538**	**64.584**	**207.896**	**9.330**	**702.169**
		2,7%	0,2%	9,2%	47,8%	9,2%	29,6%	1,3%	

Redes existentes en servicio del sistema de alcantarillado Municipio de Sincelejo - Dic. 2020									
PROCESO	Diám. (pulg)	MATERIAL / LONGITUD (m)							Longitud total (m)
		CONCRETO REFORZADO	HF	HD	PVC	MORTERO	PEAD	CERO	
Redes Mayores	52	2.560	-	-	80	-	-	-	2.640
	48	2.441	-	-	-	-	-	-	2.441
	40	1.491	-	-	-	-	-	-	1.491
	36	1.100	-	-	-	-	-	-	1.100
	30	1.803	-	-	-	-	-	-	1.803
	24	2.605	-	-	-	-	-	-	2.605
	20	3.983	-	-	-	-	-	-	3.983
	18	431	-	-	372	-	-	-	803
	16	5.047	-	-	7.443	-	-	-	12.490
	14	-	-	18	738	2.357	-	-	3.113
	12	-	-	10	5.194	6.011	-	-	11.215
	10	-	-	-	2.649	2.969	-	-	5.618
Redes Menores	8	-	-	-	22.381	230.441	-	-	252.822
Long. Total Gral (m)		**21.461**	**0**	**28**	**38.857**	**241.778**	**0**	**0**	**302.124**
		7,1%	0,0%	0,0%	12,9%	80,0%	0,0%	0,0%	

De igual manera, se muestra a continuación la relación de la totalidad de tuberías que han sido renovadas y ampliadas desde el año 2003.

DESCRIPCIÓN	MATERIAL / LONGITUD (m)			LONGITUD SUBTOTAL (m)
	HD	PEAD	PVC	
Ampliación de Redes	8.368	91.807	60.090	**160.265**
Renovación de Redes		111.979	1.166	**113.145**
SUBTOTAL (m)	**8.368**	**203.786**	**61.256**	**273.410**
LONGITUD TOTAL (m)				

Lo anterior indica que cerca de 273 km de redes de acueducto han sido intervenidas en los últimos 17 años y podrían considerarse nuevas. De igual modo, permite inferir que al menos 203 Km de los 207 Km actuales de tuberías en PEAD, han sido instalados durante el periodo comprendido entre los años 2003 y 2020, representando así un valor equivalente superior al 98%.

En síntesis, las anteriores tablas pueden consolidarse de la siguiente forma.

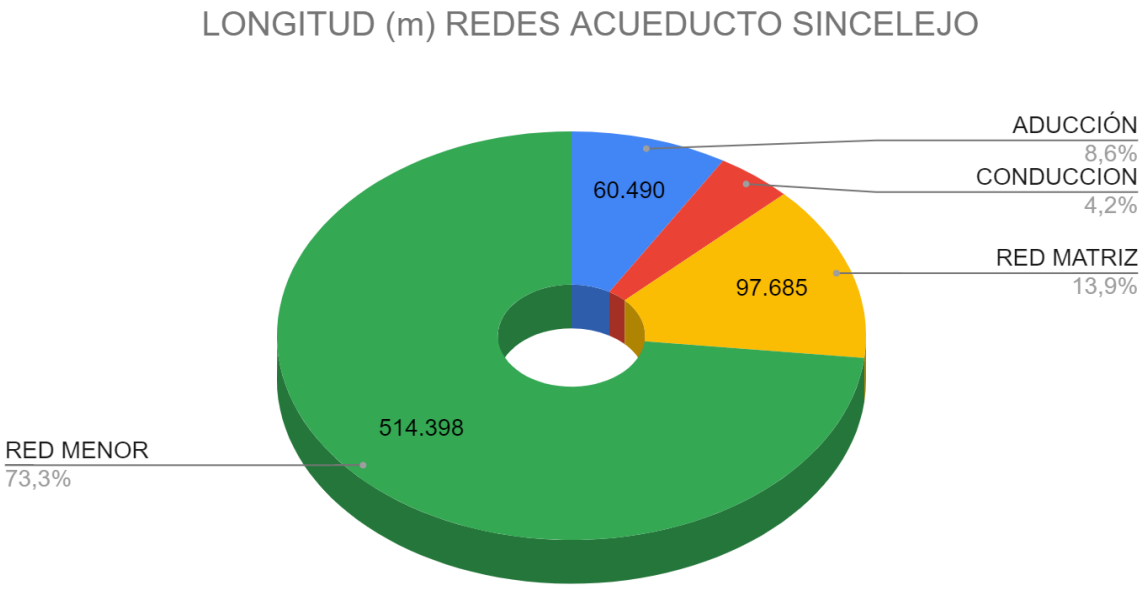

Longitud redes de acueducto

RESUMEN: REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO		
COMPONENTE	**LONGITUD (m)**	
ADUCCIÓN	60.490	
CONDUCCIÓN	29.596	
RED MATRIZ	97.685	
RED MENOR	514.398	
TOTAL LONG. REDES (m)	**702.169**	
REDES POR REPONER (m)	**102.196**	**14,6%**

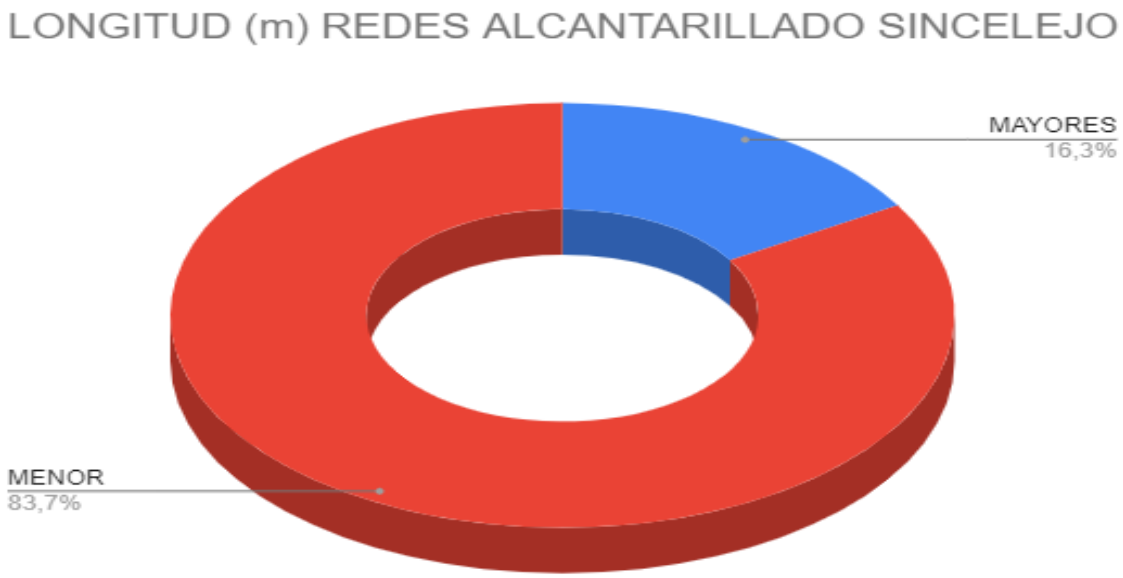

REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO		
COMPONENTE	**LONGITUD (m)**	
MAYORES	49.302	
MENOR	252.822	
TOTAL LONG. REDES (m)	302.124	
REDES POR REPONER (m)	**241.806**	**80,04%**

En materia de renovación de tuberías, puede afirmarse que entre los años 2003 y 2020 se han alcanzado logros importantes en el componente de acueducto para el cual se estima que solo resta por renovar cerca del 15% de la totalidad de las redes del sistema. El plan 90/24 acompañado del plan "Mi llave Maestra" que es programa de reducción de los de agua no contabilizada,, gradualmente se ha ido optimizando la capacidad instalada al punto de ir ampliando progresivamente el número de usuarios con servicio permanente (24 hrs / día).

3. Copia de las comunicaciones enviadas a Aguas de Sucre respecto a la reparación de la fuga de Santa Clara, donde insistimos en su reparación teniendo en cuenta la afectación que esta ocasiona al acuífero de Morroa dada la gran pérdida de agua y de los cuales no hemos obtenido respuesta alguna:

- Radicado interno No 20211340002001 de fecha 19 de agosto de 2021.
- Radicado interno No 20211340002261 del 9 de septiembre de 2021.
- Radicado interno No 20211340002731 del 11 de noviembre de 2021.
- Radicado interno No 20221340000121 del 11 de noviembre de 2022.
- Radicado interno No 20221340001521 del 31 de agosto de 2022.

Con lo anterior, pretendemos soportar lo manifestado por la empresa frente a las inquietudes de los distintos actores en el desarrollo de la reunión de seguimiento llevada a cabo el pasado 26 de octubre y evidenciar una vez más, no solo el cumplimiento a lo ordenado en sentencia de fecha 8 de septiembre de 2018 emitido por el Tribunal Administrativo de Sucre, sino también nuestro incansable interés y esfuerzo por reducir y controlar las pérdidas de agua como una gestión ordinaria, permanente y desde siempre en el desarrollo de nuestro objeto social como operadores del sistema de acueducto en la ciudad de Sincelejo.

Cordialmente

FABIO ERNESTO ARAQUE DE ÁVILA
Gerente General
Aguas de la Sabana S.A. E.S.P.
